


# NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN 20-40

Eerste voortgangsrapport oktober 2020

## 1. ORGANISATIE

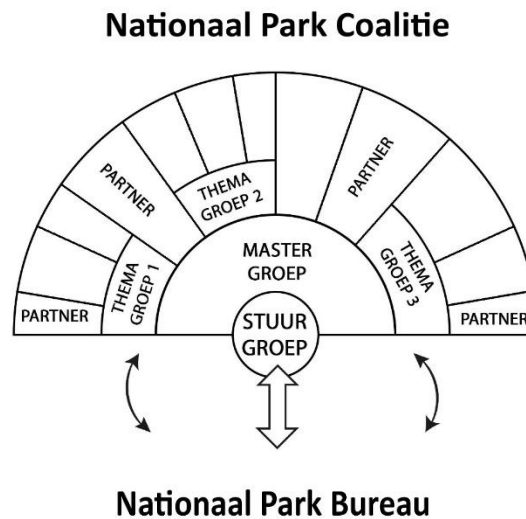

### 1.1. Nationaal Park Coalitie

De natuurbeheerders (i.c. Agentschap Natuur en Bos, Limburgs Landschap vzw, Natuurpunt vzw, Orchis vzw,...), gemeentebesturen (i.c. As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen, Zutendaal), provinciebestuur Limburg en de Vlaamse Overheid met hun relevante organisaties, diensten of agentschappen, vormen samen de “NATIONAAL PARK COALITIE”.

Partners in deze coalitie:

- onderschrijven de missie, ambitie, de ruimtelijke visie en doelstellingen van het “Masterplan 20-40” voor het Nationaal Park Hoge Kempen,
- nemen actief deel aan de overlegstructuur van het Nationaal Park Hoge Kempen (i.c. Stuurgroep-Mastergroep-Themagroepen) en het projectmatig overleg over het uitvoeren van gebied- en sectorgrensoverschrijdende acties en projecten,
- zijn binnen hun territoriale en/of sectorale bevoegdheid en mogelijkheden (mede-) initiatiefnemers en/of uitvoerder van acties teneinde de doelstellingen te halen die nodig zijn om de vooropgestelde ambities en de ruimtelijke visie van het “Masterplan 20-40” mogelijk te maken.
- werken constructief samen en wisselen kennis en informatie uit met de andere partners en het “Nationaal Park Bureau” (zie verder) .

- geven het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM) het mandaat en de middelen voor de langdurige organisatie van het “Nationaal Park Bureau” (mandaat en taakstelling: zie verder)

In totaal bestaat de Nationaal Park coalitie momenteel uit 32 coalitiepartners.

Coördinerende partner:

1. Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (Opdrachthouder Nationaal Park Bureau)

Gemeentelijke partners:

2. Gemeente As
3. Stad Bilzen
4. Stad Bree
5. Stad Dilsen-Stokkem
6. Stad Genk
7. Gemeente Oudsbergen
8. Stad Maaseik
9. Gemeente Maasmechelen
10. Gemeente Lanaken
11. Gemeente Zutendaal

Vlaamse partners:

12. Agentschap Natuur & Bos
13. Departement Omgeving
14. Agentschap Onroerend erfgoed
15. De Vlaamse Landmaatschappij
16. Departement Economie Wetenschap & Innovatie
17. Agentschap Innoveren en Ondernemen
18. Agentschap Wegen & Verkeer
19. Departement Mobiliteit & Openbare werken
20. De Vlaamse Waterweg
21. Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin
22. Toerisme Vlaanderen
23. Sport Vlaanderen

Provinciale partners:

24. Provincie Limburg
25. Bosgroep Limburg vzw
26. Toerisme Limburg vzw
27. Investeringsmaatschappij voor Limburg (nv LRM)
28. Universiteit Hasselt

Andere:

29. Limburgs Landschap vzw
30. Natuurpunt vzw
31. Orchis vzw
32. Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren

## 1.2. Stuurgroep

### Samenstelling:

De STUURGROEP omvat de bestuurlijke vertegenwoordigers van de partners die samen de “Nationaal Park Coalitie” (zie verder) vormen. Gelet op de (inter)nationale uitstraling, het hoge ambitieniveau en het sector overschrijdend karakter, zijn dat bij voorkeur de voorzitters van de relevante verenigingen, de burgemeesters van de betrokken gemeenten, gouverneur en/of gedeputeerden (Ruimte, Natuur en Toerisme) van de provincie Limburg en de (wettige vertegenwoordiger van de) bevoegde Minister(s) van de Vlaamse Regering (Ruimte, Natuur en Toerisme). De Minister bevoegd voor natuur (of haar/zijn vertegenwoordiger), neemt het voorzitterschap waar. Mits akkoord van de Stuurgroep, kunnen ambtelijke vertegenwoordigers van relevante diensten of Agentschappen als waarnemer uitgenodigd worden.

### Taakstelling:

De Stuurgroep ziet op hoofdlijnen toe op de uitvoering van het ‘Masterplan 20-40’, geeft bestuurlijke feedback en neemt strategische beslissingen over de voortgang en waar nodig bijstelling of detaillering van ambities, doelen, projecten en acties uit dit plan. Leden van de Stuurgroep koppelen terug naar het bestuur van de partner die ze vertegenwoordigen. Vergaderfrequentie: halfjaarlijks (2 keer/jaar).

### Eerste Stuurgroep: 31/01/2020 in THORPARK te Genk (=Installatievergadering)

Onder voorzitterschap van bevoegd Vlaams minister Zuhail DEMIR werd de Stuurgroep geïnstalleerd, de uittredend voorzitter Wim DRIES voor zijn volgehouden inzet gelauwerd en het “Masterplan 20-40” vastgesteld.

### Tweede Stuurgroep: 25/06/2020 in PROVINCIEHUIS te Hasselt

Onder voorzitterschap van Zuhail Demir werd een stand van zaken gegeven van de lopende initiatieven, het ontwikkelingsscenario voor de Commanderie van Gruitrode als poort tot het Nationaal Park voorgesteld en kennis genomen van de eerste bevindingen van het zogenaamde ‘Partnerplan’ met een tijdshorizon van 5 jaar (2020 – 2025).

Het NPB kreeg het mandaat om (1) de financiering van de toeristische investeringen en (2) de voorkeursscenario’s voor het uit te doven bedrijventerrein ‘Op de Berg’ uit te klaren en de eerstvolgende Stuurgroep van 11/12/2020 hierover te informeren.

### Derde Stuurgroep: 11/12/2020 (locatie: tbc)

Een derde Stuurgroep-vergadering wordt voorbereid. Deze zal vooral tot doel hebben het ‘Partnerplan 20-25’ vast te stellen

## 1.3. Mastergroep

### Samenstelling:

De MASTERGROEP omvat de ambtenaren en medewerkers die de partners van de “Nationaal Park Coalitie” vertegenwoordigen. Rekening houdend met het sector overschrijdende karakter van opgaves uit het Masterplan 20-40, en de samenstelling van de Stuurgroep, hebben deze vertegenwoordigers best een voldoende sterk mandaat (Directeur, Afdelingshoofd,...).

### Taakstelling:

De Mastergroep komt samen rond dezelfde agenda als de Stuurgroep, aan wie ze aanbevelingen en feedback geeft vanuit een ambtelijk-organisatorisch en/of juridisch-regelgevend perspectief. Leden van de Mastergroep koppelen terug naar het professionele kader van de partner die ze vertegenwoordigen. Vergaderfrequentie: halfjaarlijks (2 keer/jaar)

#### Eerste Mastergroep:

De installatievergadering van de 'Mastergroep' is gepland op 29/10/2020. Dit zal noodgedwongen een digitale vergadering zijn, en heeft als belangrijkste doelstelling om feedback in te winnen op het Partnerplan 20-25, in voorbereiding van de Stuurgroep van 11/12/2020.

## 1.4. Thema-groepen

#### Taakstelling:

Naast informatie- en kennisuitwisseling, zijn afspraken en beslispunten binnen de themagroepen nadrukkelijk uitvoeringsgericht en operationeel van aard. Waar nodig geven zij input aan Master- en Stuurgroep. Vergaderfrequentie: naar behoefte.

Twee Thema-groepen werden geïnstalleerd: 'Toerisme & Recreatie' enerzijds en 'Natuur & Ruimte' .

We beperken ons in deze rapportage tot de themagroep Natuur en Landschap

Eerste Themagroep Natuur & Landschap: Installatievergadering op 29/09/2020 in Ontmoetingscentrum Elen te Dilsen-Stokkem

## 1.5. Nationaal Park Bureau

Een multidisciplinair NATIONAAL PARK BUREAU is namens de "Nationaal Park Coalitie" belast met een reeks taken teneinde de missie, ambitie, ruimtelijke visie en doelstellingen uit het Masterplan 20-40 waar te maken. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw is de opdrachthouder voor de uitbouw van het Nationaal Park Bureau binnen haar werking.

#### Mandaat

Het mandaat van de "Nationaal Park Coalitie" aan het Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor de uitbouw van het "Nationaal Park Bureau" omvat:

- Organisatie van de overlegstructuren (i.c. secretariaat van Stuurgroep, Mastergroep, Themagroepen Toerisme, Natuur,..) en organisatie en/of deelname aan projectmatig overleg.
- Actieve ondersteuning van partners in het realiseren van acties die noodzakelijk zijn om de vooropstelde missie, ambities, ruimtelijke visie en doelstellingen van het "Masterplan 20-40" mogelijk te maken. Dit kan onder andere door acties te detecteren, plannen te detailleren, te clusteren, onderling af te stemmen, partners te inspireren, te informeren, te stimuleren en/of te coördineren en waar nodig zelf uit te voeren.
- Toetsen van plannen, projecten, acties of activiteiten van derden aan de missie en ambities van het "Masterplan 20-40" en zo nodig hen constructief te ondersteunen om, in voorkomend geval, bij te sturen.

- Een voortrekkersrol opnemen en innovatie mogelijk maken inzake gebiedsgerichte werking: grensoverschrijdend en grensverleggend.
- Organiseren en stimuleren van bewoners-, bezoekers- en ondernemersparticipatie
- Ombudsdienst voor partners, omwonenden en bezoekers bij klachten, voorstellen en vragen.
- Belangenbehartiging van het merk/beeld/concept “Nationaal Park Hoge Kempen” (i.c. voorkomen van misbruik en optimaliseren commercieel gebruik)
- Organisatie van het “Nationaal Park Fonds” van het Streekfonds Hart voor Limburg/Koning Boudewijnstichting (i.c. actieve fondsenwerving en doelmatige aanwending van de middelen).
- Organisatie van een éénduidig, performant en innovatief educatief aanbod waarin vrijwillige ‘Rangers’ centraal staan.
- Overkoepelende communicatie over en promotie van het “Nationaal Park Hoge Kempen”
- De “joint branding” van de “Poorten tot het Nationaal Park”
- Stroomlijning, realisatie en kwaliteitsbewaking van interne en externe signalisatie en communicatie
- Optimalisatie, monitoring, kwaliteitsbewaking en de organisatie van het onderhoud van de recreatieve route-structuren voor wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en menbers in en om het Nationaal Park Hoge Kempen.
- Samenwerking stimuleren met en vertegenwoordiging van het Nationaal Park Hoge Kempen in provinciale, regionale, nationale en internationale overlegstructuren, fora, netwerken, organisaties, ...

Bovengenoemde taken worden uitgevoerd in nauw overleg en in samenspraak met de relevante partners van de “Nationaal Park Coalitie”.

Medewerkers van het NP-Bureau functioneren als een professioneel collectief dat binnen de kruitlijnen van het ‘Masterplan 20-40’ en met een sterk mandaat en voldoende middelen van de NP-Coalitie, verantwoordelijk is voor en/of toeziet op een kwaliteitsvolle uitvoering van projecten en acties.



## Taken

Medewerkers van het NP-Bureau hebben allen, op hoofdlijnen, een 5-ledige opdracht:

- Uitvoeren van de gemeenschappelijke en overkoepelende acties.
- Inspireren, coördineren en faciliteren van partners in uitvoering van acties.
- Cohesie en synergie mogelijk maken tussen de (acties van de) partners onderling.
- Actief bijdragen aan en/of leiding nemen in projecten van partners.
- Tendensen en kansen detecteren en innovatie mogelijk maken en vertalen naar al dan niet bijgestelde doelen en acties.

## Personele invulling in functie van Strategisch Ruimte Project

- **Johan Van Den Bosch** - Coördinator
- **Jeroen Gillissen** - Planner, met focus op zuidelijke deelgebieden (Middenplateau, Zuidrand)
- **Luc Flipkens** – Planner, met focus op noordelijke gebieden (Klaverberg, Duinengordel, Bergerven)

Zij vormen een team met en worden ondersteunt door onderstaande medewerkers van het Nationaal Park Bureau:

- Natalie Henseler : financieel-administratief
- Els Van Goethem : administratief
- Ilse Olaerts : pers en communicatie
- Anneleen Mengels: toerisme en recreatie
- André Mulders: educatie en sensibilisatie
- Hanne Vercampt: wetenschap een wetenschapspopularisatie



## 2. REALISATIE

### 2.1. Voortgang in relatie tot de relevante doelstellingen

Hoewel het Nationaal Park Bureau (NPB) van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM) een geïntegreerde werking nastreeft, zijn 9 doelen van de 30 die in het Masterplan 20-40 zijn opgenomen, direct toewijsbaar aan de doelstellingen van het 'Strategisch Ruimte Project'.

In wat volgt, is voor elk van deze doelen de voortgang geschetst. De mate van betrokkenheid van het NPB varieert per actie en evolueert bovendien, naargelang de fase van implementatie.

Derde kolom geeft via lettercode de mate van betrokkenheid van het NPB weer

NPB is "A" initiatiefnemer en/of uitvoerder, "B" mede-initiatiefnemer en/of mede-uitvoerder of "C": direct of indirect betrokken partij bij een initiatief of de uitvoering van een actie.

Nummering van de doelstelling en paginanummers verwijzen naar het "Masterplan 20-40"

DOELSTELLING	VOORTGANG	
<b>2.SAMENHANG:</b> Mens en dier verplaatsen zich conflictvrij in het Nationaal Park. Alle wegen zijn veilig en vormen niet langer een barrière.	→ Werkzaamheden realisatie door AWV van 'Fiets- en Faunapassage Vossenbergh' onder N771 aangevat op 22/06/2020 (Masterplan: pag.73-nr.6; Partnerplan: actie 2.1)	C
	→ Vlaamse Ministers ondertekenen op 23/09/2020 het 'Vlaams Actieplan Ecologische Ontsnippering 2020-2025'. Hierin zijn (financiële) engagements opgenomen voor: 50 Miljoen Euro, waarvan 14,5 Miljoen Euro voor Projecten in het Nationaal Park Hoge Kempen. Met name: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fiets &amp; Faunapassage N771 (Partnerplan: actie 2.1)</li><li>- Ecorecreaduct Limbrug N75 (Partnerplan actie 2.2)</li><li>- Ecorecreaduct of Ecorecreatunnel N76 (Partnerplan actie 2.3)</li></ul>	C
	→ Overleg met Oudsbergen, AWV, VAPEO, ANB over locaties van ecorecreaduct(en) of -tunnel(s) N76 (Masterplan pag.73-nr.12 en 13; Partnerplan actie 2.3):	C
	→ Overleg met Dilsen-Stokkem, AWV, ANB, over Ecorecreaduct Limbrug (Masterplan pag 73, nr 7, partnerplan actie 2.2)	C
<b>3.GAAFHEID:</b> Het Nationaal Park is vrij van tegenstrijdige bestemmingen en landgebruiken.	→ Met Dilsen-Stokkem wordt in november een overleg opgestart over een actieplan voor de 'Conflictgebieden' in de gemeente, zijnde:-weekendverblijven Stokkemerbos en Costa Brava (Masterplan pag.55-nr.1&2; partnerplan actie 3.5)	C
<b>4.VERBINDEN:</b> Het Nationaal Park is intern (tussen de deelgebieden) en extern (met de omliggende grote landschappelijke	→ Overleg met het Provinciaal Natuurcentrum d.d. 29/04 over de Limburgse Natuurverbindingen (Masterplan P77, Partnerplan actie 4.1 &4.3)	C

eenheden) verbonden via open ruimte verbindingen.		
<b>5.ONTHARDEN:</b> Het Nationaal Park is vrij van overtollige verhardingen en functie-loze constructies.	→ Twee voorstellen ten behoeve van 'Blue Deal' overgemaakt aan Dep.Omgeving (i.c ontharden in ruimtelijke conflictgebieden nabij de Bosbeekvallei (Masterplan pag.55-nr.6, 7, 8 ; partnerplan actie 5.2) en het beekstelsel van de Munsterbeek (Masterplan pag.55-nr.3, 4, 5; Partnerplan actie 8.5)	A
<b>6.STILTE &amp; RUST:</b> Het Nationaal Park is een plek waar meer ruimte is voor stilte en rust.		
<b>9.LANDSCHAP:</b> Het Nationaal Park wordt omgeven door kwaliteitsvolle multifunctionele open ruimte. (=26 landschappelijke impulsgebieden en 1 ecologisch impulsgebied)	→ Met Bilzen overleg d.d. 15:10/2020 rond de invulling van het historische kasteel 'Edelhof' en de landschappelijke invulling van haar omgeving in relatie tot het Munsterbos en het Nationaal Park Hoge Kempen.	C
	→ Betrokken bij de Workshops ikv ontwerp onderzoek 'Bosbeekvallei' en waar nodig overlegd en afgestemd met steden en gemeenten (Partnerplan actie 9.2)	C
	→ Grindspoor: Voor de voormalige Grindgroevegebieden G2 en Mechelse Heide Noord maakte het NPB een gezamenlijke nota op met de partners, Provincie Limburg (Grindcomite), As, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem voor de landschappelijke en recreatieve inrichting van de ex-grindgroeves in het kader van het Nationaal Park Hoge Kempen. (partnerplan actie 8.3)	A
	→ Projecten Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL): -Revalidatietuin, Campus Sint Barbara Lanaken, landschappelijk inpassing passend bij het Nationaal Park Hoge Kempen (partnerplan actie 13.2) -Bloem & Bos, campus Sint Jan Genk, landschappelijke inpassing passend bij het Nationaal Park Hoge Kempen (partnerplan actie 13.1)	B
	→ Structuurvisie Klaverberg: Structuurvisie Klaverberg wordt opgesteld door ANB, samen met gemeente As, Stad Genk en Gemeente Oudsbergen voor een landschappelijke structuurvisie voor het deelgebied Klaverberg. (partnerplan actie 8.9)	C
	→ Complex project Donderslag: Er was overleg over de voortgang van de Landschapsstudie in opdracht van het Departement Omgeving, de Hydrologische studie in opdracht van Agentschap Natuur en Bos en de Landbouwstudie in opdracht van Oudsbergen	C
→ Complex project Op den Berg: Er was overleg met Departement Omgeving over de voortgang en te ontwikkelen volgende stappen	B	
<b>12.MILIEU &amp; KLIMAAT:</b>		



<p>Het Nationaal Park draagt actief bij aan een duurzaam milieu- en klimaatbeleid via koolstof-neutraliteit, klimaatadaptatie en duurzaam toerisme.</p>		
<p><b>16. BEREIKEN:</b> De toegangspoorten van het Nationaal Park zijn vlot en op duurzame wijze bereikbaar.</p>	<p>→ Overleg met AWV over signalisatie gepland op 29/10/20 (partnerplan actie 16.1)</p> <p>→ Overleg met de provincie Limburg in het kader van de verbetering van het fietsroutenetwerk. De Provincie Limburg maakt een inventarisatie van de knelpunten op het netwerk (partnerplan actie 21.1)</p> <p>→ Overleg met de gemeente Maasmechelen en de Provincie Limburg voor de mobiliteitsaanpassingen aan de toegangspoort Mechelse Heide. (Efficiëntere inrichting parkeermogelijkheid, aanleg 'satteliet' parking aan het Zwembad Prinsenpark) (partnerplan actie 17.8)</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>B</p>
<p><b>17. BEZOEKEN:</b> Het Nationaal Park is te bezoeken vanuit 1 hoofdtoegangspoort en 8 toegangspoorten.</p>	<p>→ Voorstelling van het Masterplan 20-40 aan Limburg Sterk Merk met het oog op de aanmelding van de vraag tot financiering voor de nieuw uit te bouwen en te actualiseren toegangspoorten (</p> <p>→ De gemeente Oudsbergen werd ondersteund in het traject met architecten en studiebureaus om het concept en de invulling voor de toegangspoort Commanderie Gruitrode te laten ontwikkelen tot de eerste ontwerpplannen in september 2020</p>	<p>A</p> <p>B</p>
<p><b>23. MOUNTAINBIKEN</b> Twee aangrenzende mountainbikenetwerken in de region van het Nationaal Park vormen één netwerk, met een differentiatie op basis van technische uitdagingen.</p>	<p>→ Plaatsbezoeken, overleg en inventarisatie waarbij een voorstel voor recreatief medegebruik ontwikkeld wordt in overleg met de stad Maaseik, mountainbikeclub, Sport Vlaanderen en ANB om een ruimtelijk planningsinitiatief te vermijden)</p>	<p>B</p>
<p><b>27. ORGANISEREN</b> Een multidisciplinair Nationaal Park Bureau (NPB) organiseert dankzij een duidelijk mandaat de uitvoering van het Masterplan 20-40</p>	<p>→ Het NPB is vanaf 01/01/20 met 9 FTE's operationeel en stemt onderling af in wekelijkse teamvergaderingen.</p> <p>→ Met coalitie-partners (Gemeenten, Dep. Omgeving,, Agentschap Wegen en Verkeer,..) wordt bilateraal overlegd, vooral in functie van 'Partnerplan 20-25'</p> <p>→ Met Agentschap Natuur en Bos is dit overleg structureel en wordt maandelijks met de regiobeheerder afgestemd</p> <p>→ 2 stuurgroepen georganiseerd (31/10/20 en 25/06/20 ) en één in voorbereiding (11/12/20)</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>

	→ 1 Mastergroep in voorbereiding (29/10/20)	A
	→ 1 Thema-groep Natuur & Ruimte georganiseerd (29/09/20)	A

## 2.2.OVERLEGMOMENTEN

Johan Van Den Bosch, Coördinator:

03/03 : Overleg grindsector Dilsen-Stokkem

06/03 : Startoverleg Strategische Project met Dep.Omgeving

06/03 : Stuurgroep Terhills met gemeente Maasmechelen

09/03 : Overleg burgemeester Oudsbergen over Commanderie Gruitrode

11/03 : Overleg Kabinet Demir

06/04 : Stuurgroep Commanderie

16/04 : Overleg partners Commanderie Gruitrode

22/04 : Maandoverleg Agentschap Natuur en Bos

23/04 : Overleg CBS Oudsbergen

23/04 : Overleg Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst RLKM

06/05 : Klankbordgroep "Ruimtelijk Regionale Identiteit Limburg (Beleidsplan Ruimte Limburg)

07/05 : Kennisuitwisseling Nationaal Parken Bureau Nederland

20/05 : Bijdrage aan webinar VRP Publieke ruimte

29/05 : Terreinbezoek en overleg Kolenspoor met Provincie Limburg

25/06 : Stuurgroep NPHK

02/06 : Kwaliteitsimpuls tuinwijken Genk

03/06 : Stuurgroep Terhills

07/07 : Input voor studie over concept Nationale Parken in Vlaanderen

08/07 : Overleg Toerisme Vlaanderen (Peter De Wilde)

10/07 : Toelichting en debat over "Ruimtelijke Regionale Identiteit Limburg (Beleidsplan Ruimte Limburg)

13/07 : Gecoro Maasmechelen

17/08 : Overleg Dep.Omgeving over Complex Project Op de Berg

21/08 : Kennisuitwisseling Strategisch Ruimte Project Scheldevallei

31/08 : Overleg kabinet Demir

01/09 : Dilsen-Stokkem: ruimtelijke conflictgebieden  
07/09 : Bijdrage aan webinar UNESCO over gebiedserkenningen  
16/09 : Overleg gemeenten en provincie over 'Grindspoor'  
18/09 : Maandoverleg ANB  
29/09 : Interview Grindfonds  
30/09 : Overleg LSM  
15/10 : Bijdrage voor lerend netwerk Regionale Landschappen

Jeroen Gilissen, Planner Zuidelijke gebieden:

04/03: Overleg ikv Grindspoor  
06/03: Startoverleg Strategisch Project NPHK  
12/03: Terreinbezoek Landschapsstudie 'Bosbeekvallei'  
18/03: Terreinbezoek Grindspoor  
29/04: Overleg Natuurverbindingen Provinciaal Natuur Centrum  
15/07: Zol revalidatieparcours Campus Sint Barbara (Lanaken) en Bloem & Bos Campus Sint-Jan (Genk)  
01/09: Overleg Dilsen-Stokkem: conflictgebieden Weekendverblijven Costa Brava en Stokkemerbos  
10/09: Overleg Maasmechelen: Terreinbezoek inrichting Parking Prinsenpark  
16/09: Structuurvisie Klaverberg  
23/09: Overleg Ontwerpend onderzoek bosbeekvallei (onderwerp: Eilandje)  
29/09: Themagroep Natuur & Ruimte  
1/10: Overleg provincie Limburg inventarisatie knelpunten Fietsrouten netwerk

Luc Flipkens, planner Noordelijke gebieden:

09/03: Concept en ontwikkeling toegangspoort Commanderie Gruitrode  
09/04: Afspraken Oudsbergen en Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed ikv investeringen Commanderie Gruitrode  
27/04: Ontwikkeling aanvraag LIFE Landduinen met o.a. ANB  
28/04: Afstemming Ontwerpend onderzoek Bosbeekvallei met stad Maaseik  
05/05: Ontwikkeling traject vernieuwde Lange Afstandswandeling Nationaal Park Hoge Kempen  
08/05: Voorbereiding concept Kuil Waterloos met stad Maaseik en mountainbikeclub  
25/05: Ontwikkeling aanvraag LIFE Landduinen met o.a. ANB



28/05: Plaatsbezoek Kuil Waterlooos naar invulling met stad Maaseik, ANB en Sport Vlaanderen

02/06 Ontwikkeling traject vernieuwde Lange Afstandswandeling Nationaal Park Hoge Kempen

04/06: Complex project Donderslag – Landschapsstudie

25/06: Ontwikkeling aanvraag LIFE Landduinen met o.a. ANB

07/07: Concept en ontwikkeling toegangspoort Commanderie Gruitrode

09/07: Complex project Donderslag – Landbouwstudie VLM Oudsbergen

15/07: Plaatsbezoek Brouwerij Cornelissen Opitter als toekomstige instapplek

17/08: Complex project Op den Berg – overleg Dep. Omgeving

28/08: Ontwikkeling geactualiseerde Toegankelijkheidsregeling Nationaal Park - ANB

01/09: Herinrichting Prinsenpark Maasmechelen

10/09: Complex project Donderslag – Hydrologische studie

15/09: Ontwikkeling traject vernieuwde Lange Afstandswandeling Nationaal Park Hoge Kempen

30/09: Ontsnippering N76: gemeente Oudsbergen, AWV, VAPEO, ANB

30/09: Voorstelling Masterplan 20-40 aan Limburg Sterk Merk

01/10: Ontwikkelingen Toeristisch Fietsroutenetwerk Provincie Limburg in en om Duinengordel – Provincie Limburg

06/10: Plaatsbezoek herinrichting toegangspoort Kattevennen Genk

09/10: Complex project Donderslag - Kernteam

16/10: Concept en ontwikkeling toegangspoort Commanderie Gruitrode

22/10: Input voor beleidskader Fietsbeleid provincie Limburg in ruimtelijk beleidsplan

Verslag: Johan Van Den Bosch

